ООО «ВольтМаркет»

Проект «Разработка и внедрение информационной системы «ВольтМаркет»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ВольтМаркет»

_____

«14» августа 2026 г.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Информационная система «ВольтМаркет»

учёт закупок, продаж, бронирования и складских остатков магазина электроники

Редакция 1.0 от 14.08.2026

Разработан в соответствии с Руководством PMBOK®, 5-е издание

Руководитель проекта

_____ А. Фролов

Санкт-Петербург

2026

АННОТАЦИЯ

Документ является планом управления проектом «Разработка и внедрение информационной системы «ВольтМаркет» и разработан по Руководству PMBOK® 5-го издания (процесс 4.2 «Разработка плана управления проектом»).

План включает базовые планы по содержанию, расписанию и стоимости и вспомогательные планы управления содержанием, требованиями, расписанием, стоимостью, качеством, совершенствованием процессов, человеческими ресурсами, коммуникациями, рисками, закупками и заинтересованными сторонами.

Плановый срок проекта – с 03.08.2026 по 31.12.2026, бюджет – 3 889 200 руб. Документ составлен ретроспективно на дату 14.08.2026.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения 6

1.1 Назначение плана 6

1.2 Состав плана и ответственные 6

1.3 Жизненный цикл проекта 7

1.4 Процессы управления проектом 8

1.5 Управление изменениями 8

1.6 Управление конфигурацией 9

1.7 Пересмотр плана 9

2 Базовый план по содержанию 10

2.1 Описание содержания проекта 10

2.2 Иерархическая структура работ 10

2.3 Словарь ИСР 11

3 Базовое расписание 14

4 Базовый план по стоимости 18

5 План управления содержанием 22

5.1 Определение содержания 22

5.2 Создание ИСР 22

5.3 Подтверждение содержания 22

5.4 Контроль содержания 22

6 План управления требованиями 23

6.1 Сбор и документирование требований 23

6.2 Приоритизация 23

6.3 Трассировка требований 23

6.4 Управление изменениями требований 24

7 План управления расписанием 25
7.1 Оценка длительности 25
7.2 Контроль расписания 25
8 План управления стоимостью 26
8.1 Метод освоенного объёма 26
8.2 Контроль стоимости 27
9 План управления качеством 28
9.1 Стандарты и требования к качеству 28
9.2 Обеспечение качества 28
9.3 Контроль качества 29
10 План совершенствования процессов 30
11 План управления человеческими ресурсами 31
11.1 Организационная структура 31
11.2 Роли и ответственность 31
11.3 Ресурсный календарь 32
11.4 Набор, развитие и высвобождение 32
11.5 Правила работы команды 33
12 План управления коммуникациями 34
12.1 Эскалация 34
12.2 Шаблон статус-отчёта 34
13 План управления рисками 36
13.1 Методология 36
13.2 Категории рисков 37
13.3 Реестр рисков 37
13.4 Мониторинг рисков 39

14 План управления закупками 40
14.1 Решения «производить или покупать» 40
14.2 Типы договоров 40
14.3 Выбор подрядчика 40
14.4 Управление договорами и закрытие 41
15 План управления заинтересованными сторонами 42
15.1 Реестр заинтересованных сторон 42
15.2 Матрица вовлечённости 42
15.3 Стратегии вовлечения 43
Список использованных источников 44
Приложение А Распределение работ по подготовке плана 45

1 Общие положения

Раздел подготовил: А. Фролов, руководитель проекта

1.1 Назначение плана

План управления проектом определяет, как проект «Разработка и внедрение информационной системы «ВольтМаркет» выполняется, контролируется и закрывается. План разработан в процессе 4.2 «Разработка плана управления проектом» Руководства PMBOK® 5-го издания на основе устава проекта от 07.08.2026 и объединяет базовые планы по содержанию, расписанию и стоимости и вспомогательные планы управления по всем областям знаний.

План утверждается спонсором проекта на контрольном событии КС2 (14.08.2026). После утверждения базовые планы меняются только через процедуру управления изменениями (подраздел 1.5).

1.2 Состав плана и ответственные

Таблица 1 – Состав плана управления проектом

Раздел	Содержание	Процесс PMBOK	Ответственный
1	Общие положения, жизненный цикл, управление изменениями	4.2 Разработка плана управления проектом	А. Фролов
2	Базовый план по содержанию	5.4 Создание ИСР	Г. Киселев
3	Базовое расписание	6.6 Разработка расписания	Д. Капалбаев
4	Базовый план по стоимости	7.3 Определение бюджета	С. Шыхыев
5	План управления содержанием	5.1 Планирование управления содержанием	Г. Киселев
6	План управления требованиями	5.1, 5.2 Сбор требований	Г. Киселев
7	План управления расписанием	6.1 Планирование управления расписанием	Д. Капалбаев
8	План управления стоимостью	7.1 Планирование управления стоимостью	С. Шыхыев
9	План управления качеством	8.1 Планирование управления качеством	Г. Курылев
10	План совершенствования процессов	8.1 Планирование управления качеством	Г. Курылев

Раздел	Содержание	Процесс PMBOK	Ответственный
11	План управления человеческими ресурсами	9.1 Планирование управления человеческими ресурсами	А. Елизаров
12	План управления коммуникациями	10.1 Планирование управления коммуникациями	А. Елизаров
13	План управления рисками	11.1 Планирование управления рисками	Линь Хаоюнь
14	План управления закупками	12.1 Планирование управления закупками	Чжан Жуйюй
15	План управления заинтересованными сторонами	13.2 Планирование управления заинтересованными сторонами	Чжан Жуйюй

1.3 Жизненный цикл проекта

Для проекта выбран предиктивный (каскадный) жизненный цикл: требования к системе определены заказчиком заранее, срок и бюджет фиксированы. Проект разбит на фазы, совпадающие с элементами первого уровня ИСР. Каждая фаза завершается контрольным событием, на котором спонсор принимает результат фазы и разрешает переход к следующей.

Таблица 2 – Фазы проекта

Фаза	Сроки	Результат фазы	Контрольное событие
Инициация и планирование	03.08 – 14.08	Устав, план управления проектом	КС1, КС2
Анализ и требования	10.08 – 28.08	Техническое задание	КС3
Проектирование	31.08 – 18.09	Модель данных, фирменный стиль, макеты	КС4
Разработка	14.09 – 30.10	Конфигурация 1.2	КС5
Интернет-витрина	21.09 – 20.11	Сайт с обменом данными	КС6
Испытания и документация	19.10 – 02.12	Протокол испытаний, документация	КС7
Внедрение	09.11 – 18.12	Работающая система, обученный персонал	КС8
Закрытие	21.12 – 30.12	Акт закрытия, извлечённые уроки	КС9

1.4 Процессы управления проектом

В проекте применяются процессы всех пяти групп Руководства PMBOK®. Степень детализации процессов выбрана с учётом размера проекта: 8 сотрудников, 5 месяцев, один подрядчик.

Таблица 3 – Применение групп процессов

Группа процессов	Как применяется в проекте
Инициация	Устав проекта, реестр заинтересованных сторон (03.08 – 07.08)
Планирование	Настоящий план, ИСР, расписание, бюджет, реестр рисков (10.08 – 14.08); уточнение планов на каждом контрольном событии
Исполнение	Выполнение пакетов работ ИСР, обеспечение качества, проведение закупок, развитие команды, распространение информации
Мониторинг и контроль	Еженедельный статус по освоенному объёму, контроль изменений, контроль качества тест-кейсами, мониторинг рисков
Закрытие	Приёмка результатов, закрытие договоров, реестр извлечённых уроков, архив проекта (21.12 – 30.12)

1.5 Управление изменениями

Любое изменение содержания, сроков или стоимости оформляется запросом на изменение. Порядок рассмотрения:

1. инициатор (любой участник или заинтересованная сторона) описывает изменение и причину в журнале изменений;
2. бизнес-аналитик и руководитель проекта в течение двух рабочих дней оценивают влияние на содержание, расписание, стоимость, качество и риски;
3. решение принимает руководитель проекта или совет по изменениям в зависимости от масштаба изменения (таблица ниже);
4. при одобрении обновляются базовые планы и затронутые документы, команда и заинтересованные стороны получают уведомление;
5. отклонённый запрос закрывается с указанием причины.

Таблица 4 – Уровни принятия решений по изменениям

Масштаб изменения	Кто утверждает
Сдвиг работы до 3 рабочих дней без влияния на контрольные события, стоимость до 50 000 руб.	Руководитель проекта
Сдвиг контрольного события, стоимость от 50 000 до 200 000 руб., изменение требований	Совет по изменениям: спонсор, руководитель проекта, бизнес-аналитик
Стоимость свыше 200 000 руб., использование управленческого резерва, перенос окончания проекта	Спонсор проекта

1.6 Управление конфигурацией

Исходные файлы конфигурации 1С и документация хранятся в репозитории Git. Каждой поставке присваивается номер версии (1.0 – базовый учёт, 1.1 – бронирование, 1.2 – автоснятие броней и отчёт о доступности). Документы проекта имеют номер редакции и дату; действующая редакция хранится в общей папке проекта, предыдущие сохраняются в истории репозитория.

1.7 Пересмотр плана

Руководитель проекта проверяет актуальность плана на каждом контрольном событии. Изменения вносятся через процедуру подраздела 1.5, новая редакция утверждается спонсором.

2 Базовый план по содержанию

Раздел подготовил: Г. Киселев, бизнес-аналитик

Базовый план по содержанию состоит из утверждённого описания содержания проекта, иерархической структуры работ (ИСР) и словаря ИСР.

2.1 Описание содержания проекта

Содержание продукта: конфигурация «ВольтМаркет» на платформе 1С:Предприятие 8.3 (справочники, документы закупки, продажи, бронирования и отмены брони, регистры сведений и накопления, отчёты, роли, рабочий стол, регламентное задание автоснятия броней, фирменный стиль, интерфейс на русском и китайском языках), интернет-витрина с обменом данными и комплект документации.

Содержание проекта: все работы ИСР от обследования до закрытия проекта, включая закупку оборудования и лицензий, перенос данных, обучение персонала и опытную эксплуатацию. Исключения из содержания, допущения и ограничения приведены в разделах 5 и 7 устава проекта.

Критерии приёмки: результат принимается, если он соответствует техническому заданию, прошёл испытания по программе раздела 9 и подписан лицом, указанным в разделе 6 устава.

2.2 Иерархическая структура работ

ИСР построена по фазам жизненного цикла. Нижний уровень ИСР – пакеты работ, для которых определены результат, ответственный, сроки и трудоёмкость.



Рисунок 1 – Иерархическая структура работ проекта

2.3 Словарь ИСР

Таблица 5 – Словарь ИСР

Код	Пакет работ	Результат	Ответственный	Трудоёмкость, чел.-дн.
1.1	Инициация, устав проекта	Утверждённый устав проекта	А. Фролов	6
1.2	Планирование, план управления проектом	Утверждённый план управления проектом	А. Фролов	17
1.3	Мониторинг и контроль	Еженедельные отчёты о статусе, журнал изменений	А. Фролов	20
1.4	Закрытие проекта	Акт закрытия, реестр извлечённых уроков	А. Фролов	11
2.1	Обследование процессов магазина	Отчёт об обследовании	Г. Киселев	10
2.2	Техническое задание	Согласованное техническое задание	Г. Киселев	13
3.1	Модель данных и состав метаданных	Схема объектов конфигурации	А. Фролов	10
3.2	Фирменный стиль и прототипы интерфейса	Палитра, логотип, макеты форм	Д. Капалбаев	14
4.1	Справочники, регистры и цены	Справочники, регистр сведений «Цены», регистры накопления	А. Фролов	10

Код	Пакет работ	Результат	Ответственный	Трудоёмкость, чел.-дн.
4.2	Документы закупки и продажи	Документы «Приход» и «Расход» с контролем остатков	А. Фролов	10
4.3	Роли и права доступа	Роли «Покупка», «Продажа», «Полные права»	А. Фролов	4
4.4	Отчёты и рабочий стол	Отчёты «Остатки товаров», «Анализ продаж», рабочий стол	А. Фролов	10
4.5	Бронирование товаров	Документы «Бронирование» и «Отмена брони»	А. Фролов	10
4.6	Автоснятие броней и отчёт о доступности	Регламентное задание, отчёт «Остаток, забронировано, доступно»	А. Фролов	4
4.7	Китайская локализация интерфейса	Интерфейс на китайском языке	Линь Хаоюнь	22
5.1	Разработка интернет-витрины (подрядчик)	Сайт магазина с каталогом	Подрядчик, контроль – А. Фролов	2
5.2	Обмен данными сайта с 1С	Выгрузка каталога, цен и остатков на сайт	А. Фролов	5
5.3	Приёмка интернет-витрины	Акт приёмки сайта	Г. Курылев	5
6.1	Программа испытаний и тест-кейсы	Программа и методика испытаний	Г. Курылев	9
6.2	Функциональные испытания	Журнал дефектов, исправленная конфигурация	Г. Курылев	15
6.3	Приёмочные испытания	Протокол приёмочных испытаний	Г. Курылев	8
7.1	Описание системы по ГОСТ	Документация о системе	Г. Киселев	10
7.2	Руководство пользователя	Инструкция пользователя	С. Шыхыев	15
7.3	Руководство пользователя на китайском	Инструкция на китайском языке	Линь Хаоюнь	12
7.4	Документация о дизайне	Описание фирменного стиля	Д. Капалбаев	5
7.5	Протокол испытаний	Протокол испытаний	Г. Курылев	3
8.1	Закупка оборудования и лицензий	Установленные сервер и лицензии	А. Елизаров	3

Код	Пакет работ	Результат	Ответственный	Трудоёмкость, чел.-дн.
8.2	Перенос справочников и остатков	Рабочая база с начальными остатками	А. Елизаров	7
8.3	Обучение персонала	Обученные продавцы и закупщик	А. Елизаров	9
8.4	Опытная эксплуатация	Акт ввода в эксплуатацию	А. Елизаров	12
8.5	Презентация системы заказчику	Презентация и выступление	А. Елизаров	4

Общая трудоёмкость работ команды – 295 чел.-дн., без учёта работ подрядчика.

3 Базовое расписание

Раздел подготовил: Д. Капалбаев, дизайнер интерфейса и фирменного стиля

Базовое расписание построено методом критического пути в рабочих днях с учётом производственного календаря 2026 года (4 ноября и 31 декабря – нерабочие дни). Расписание утверждено вместе с планом на контрольном событии КС2.

Таблица 6 – Расписание пакетов работ

Код	Пакет работ	Начало	Окончание	Длит., раб. дн.	Предшественники
1.1	**Инициация, устав проекта**	03.08.2026	07.08.2026	5	–
1.2	Планирование, план управления проектом	10.08.2026	14.08.2026	5	1.1
1.3	Мониторинг и контроль	17.08.2026	25.12.2026	94	1.2
1.4	**Закрытие проекта**	21.12.2026	30.12.2026	8	8.4
2.1	**Обследование процессов магазина**	10.08.2026	21.08.2026	10	1.1
2.2	**Техническое задание**	17.08.2026	28.08.2026	10	2.1 (НН+5)
3.1	**Модель данных и состав метаданных**	31.08.2026	11.09.2026	10	2.2
3.2	Фирменный стиль и прототипы интерфейса	31.08.2026	18.09.2026	15	2.2
4.1	**Справочники, регистры и цены**	14.09.2026	25.09.2026	10	3.1
4.2	**Документы закупки и продажи**	21.09.2026	02.10.2026	10	4.1 (НН+5)
4.3	Роли и права доступа	28.09.2026	02.10.2026	5	4.2 (НН+5)
4.4	**Отчёты и рабочий стол**	05.10.2026	16.10.2026	10	4.2; 4.3
4.5	**Бронирование товаров**	12.10.2026	23.10.2026	10	4.4 (НН+5)
4.6	**Автоснятие броней и отчёт о доступности**	26.10.2026	30.10.2026	5	4.5
4.7	Китайская локализация интерфейса	12.10.2026	30.10.2026	15	3.2; 4.4 (НН+5)
5.1	Разработка интернет-витрины (подрядчик)	21.09.2026	13.11.2026	39	3.2
5.2	Обмен данными сайта с 1С	02.11.2026	13.11.2026	9	4.6
5.3	Приёмка интернет-витрины	16.11.2026	20.11.2026	5	5.1; 5.2
6.1	Программа испытаний и тест-кейсы	19.10.2026	30.10.2026	10	4.4

Код	Пакет работ	Начало	Окончание	Длит., раб. дн.	Предшественники
6.2	**Функциональные испытания**	02.11.2026	20.11.2026	14	4.6; 6.1
6.3	**Приёмочные испытания**	23.11.2026	27.11.2026	5	6.2
7.1	Описание системы по ГОСТ	26.10.2026	20.11.2026	19	4.5
7.2	Руководство пользователя	26.10.2026	27.11.2026	24	4.5
7.3	Руководство пользователя на китайском	09.11.2026	27.11.2026	15	7.2 (НН+10)
7.4	Документация о дизайне	19.10.2026	30.10.2026	10	4.4
7.5	Протокол испытаний	23.11.2026	02.12.2026	8	6.3
8.1	Закупка оборудования и лицензий	09.11.2026	20.11.2026	10	2.2
8.2	**Перенос справочников и остатков**	30.11.2026	04.12.2026	5	6.3; 8.1
8.3	Обучение персонала	07.12.2026	11.12.2026	5	8.2
8.4	**Опытная эксплуатация**	07.12.2026	18.12.2026	10	8.2
8.5	Презентация системы заказчику	14.12.2026	16.12.2026	3	8.3 (НН+5)

Жирным выделены работы критического пути: 1.1 → 2.1 → 2.2 → 3.1 → 4.1 → 4.2 → 4.4 → 4.5 → 4.6 → 6.2 → 6.3 → 8.2 → 8.4 → 1.4. Задержка любой из них сдвигает дату ввода системы в эксплуатацию.

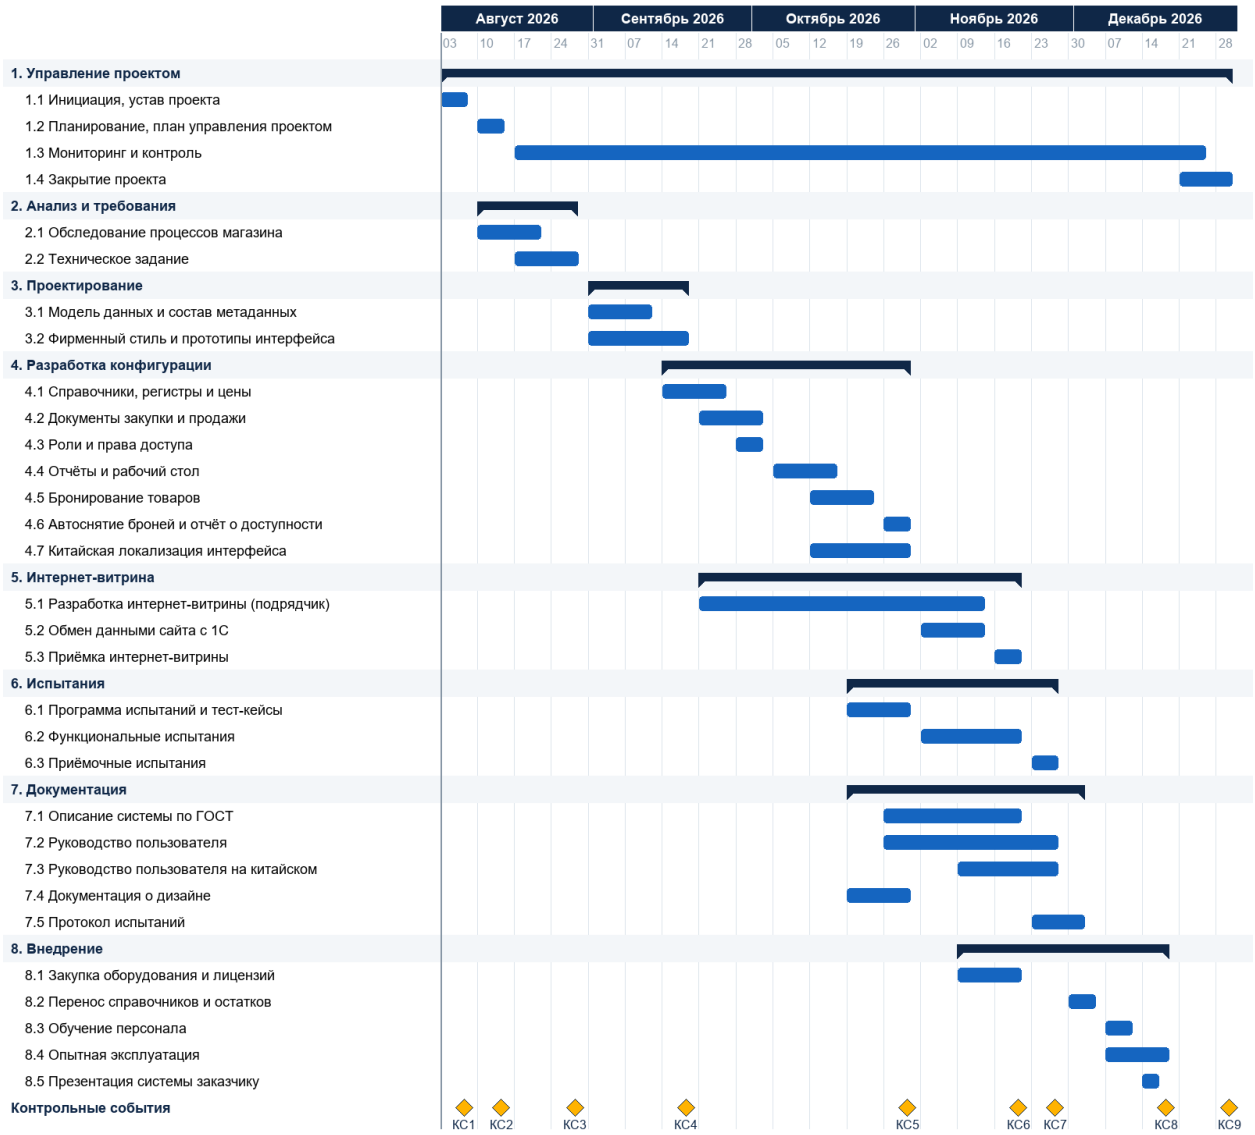


Рисунок 2 – Диаграмма Ганта проекта

Таблица 7 – Контрольные события

Код	Контрольное событие	Дата	Подтверждающий документ
КС1	Устав проекта утверждён	07.08.2026	Подписанный устав
КС2	План управления проектом утверждён	14.08.2026	Подписанный план
КС3	Техническое задание согласовано	28.08.2026	Лист согласования ТЗ
КС4	Проектные решения и фирменный стиль согласованы	18.09.2026	Протокол совещания
КС5	Конфигурация 1.2 передана на испытания	30.10.2026	Акт передачи на испытания
КС6	Интернет-витрина принята	20.11.2026	Акт приёмки сайта
КС7	Приёмочные испытания завершены	27.11.2026	Протокол испытаний
КС8	Система введена в эксплуатацию	18.12.2026	Акт ввода в эксплуатацию
КС9	Проект закрыт	30.12.2026	Акт закрытия проекта

Между окончанием работ (30.12.2026) и директивным сроком проекта (31.12.2026) нет запаса по времени, поэтому резерв по срокам заложен внутри фаз: опытная эксплуатация (8.4) может быть сокращена на 3 рабочих дня без потери результата.

4 Базовый план по стоимости

Раздел подготовил: С. Шыхыев, технический писатель (руководство пользователя)

Базовый план по стоимости – утверждённый бюджет проекта с распределением по времени, без управленческого резерва. Стоимость работ рассчитана снизу вверх по пакетам ИСР: трудоёмкость × дневная ставка роли. Дневная ставка = месячный оклад / 21 рабочий день × (1 + 30.2 % страховых взносов). Накладные расходы (рабочие места, связь, программы) – 10 % от оплаты труда.

Таблица 8 – Ставки ролей

Роль	Оклад в месяц, руб.	Ставка в день со взносами, руб.	Трудоёмкость, чел.-дн.	Оплата труда, руб.
Руководитель проекта, ведущий разработчик 1С (А. Фролов)	180 000	11 160	110	1 227 600
Бизнес-аналитик, технический писатель (документация по ГОСТ) (Г. Киселев)	130 000	8 060	43	346 580
Дизайнер интерфейса и фирменного стиля (Д. Капалбаев)	110 000	6 820	24	163 680
Технический писатель (руководство пользователя) (С. Шыхыев)	100 000	6 200	20	124 000
Инженер по тестированию (Г. Курылев)	110 000	6 820	33	225 060
Специалист по внедрению и обучению (А. Елизаров)	100 000	6 200	29	179 800
Специалист по локализации (китайский язык) (Линь Хаоюнь)	90 000	5 580	18	100 440
Специалист по локализации (китайский язык) (Чжан Жуйюй)	90 000	5 580	18	100 440

Таблица 9 – Смета по пакетам работ

Код	Пакет работ	Труд и накладные, руб.	Закупки, руб.	Итого, руб.
1.1	Инициация, устав проекта	70 200	–	70 200
1.2	Планирование, план управления проектом	165 700	–	165 700
1.3	Мониторинг и контроль	245 500	–	245 500
1.4	Закрытие проекта	98 900	–	98 900
2.1	Обследование процессов магазина	95 500	–	95 500
2.2	Техническое задание	125 500	–	125 500
3.1	Модель данных и состав метаданных	109 100	–	109 100
3.2	Фирменный стиль и прототипы интерфейса	107 800	–	107 800
4.1	Справочники, регистры и цены	122 800	–	122 800
4.2	Документы закупки и продажи	122 800	–	122 800
4.3	Роли и права доступа	45 700	–	45 700
4.4	Отчёты и рабочий стол	103 700	–	103 700
4.5	Бронирование товаров	115 900	–	115 900
4.6	Автоснятие броней и отчёт о доступности	49 100	–	49 100
4.7	Китайская локализация интерфейса	147 300	–	147 300
5.1	Разработка интернет-витрины (подрядчик)	24 600	552 000	576 600
5.2	Обмен данными сайта с 1С	61 400	–	61 400
5.3	Приёмка интернет-витрины	42 300	–	42 300
6.1	Программа испытаний и тест-кейсы	68 900	–	68 900
6.2	Функциональные испытания	126 900	–	126 900
6.3	Приёмочные испытания	68 200	–	68 200
7.1	Описание системы по ГОСТ	88 700	–	88 700
7.2	Руководство пользователя	102 300	–	102 300
7.3	Руководство пользователя на китайском	73 700	–	73 700
7.4	Документация о дизайне	37 500	–	37 500
7.5	Протокол испытаний	22 500	–	22 500
8.1	Закупка оборудования и лицензий	20 500	245 000	265 500
8.2	Перенос справочников и остатков	58 700	–	58 700
8.3	Обучение персонала	61 400	–	61 400

Код	Пакет работ	Труд и накладные, руб.	Закупки, руб.	Итого, руб.
8.4	Опытная эксплуатация	103 700	–	103 700
8.5	Презентация системы заказчику	28 000	–	28 000
	Итого	**2 714 800**	**797 000**	**3 511 800**

Таблица 10 – Закупки в составе сметы

Пакет	Позиция	Сумма, руб.
5.1	Договор на разработку интернет-витрины	540 000
5.1	Хостинг и домен на 12 месяцев	12 000
8.1	Сервер для информационной базы	160 000
8.1	Источник бесперебойного питания	25 000
8.1	Лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ на 6 рабочих мест	60 000

Таблица 11 – Структура бюджета проекта

Статья	Сумма, руб.
Оплата труда со страховыми взносами	2 467 600
Накладные расходы (10 %)	246 800
Закупки и договор с подрядчиком	797 000
Оценка стоимости работ	**3 511 800**
Резерв на возможные риски (раздел 13)	192 200
Базовый план по стоимости	**3 704 000**
Управленческий резерв (5 % от базового плана)	185 200
Бюджет проекта	**3 889 200**

Небольшие расхождения между суммой оплаты труда и накладных и итогом сметы связаны с округлением каждого пакета до 100 руб.

Таблица 12 – Распределение базового плана по месяцам

Месяц	Плановые расходы, руб.	Нарастающим итогом, руб.	Доля от оценки, %
Август 2026	503 700	503 700	14.3
Сентябрь 2026	671 800	1 175 500	33.5
Октябрь 2026	897 200	2 072 700	59.0
Ноябрь 2026	1 044 900	3 117 600	88.8
Декабрь 2026	394 200	3 511 800	100.0

Месяц	Плановые расходы, руб.	Нарастающим итогом, руб.	Доля от оценки, %
Резерв на возможные риски	192 200	3 704 000	–

Нарастающий итог по месяцам образует S-кривую базового плана, с которой сравнивается освоенный объём (раздел 8). Оплата подрядчику: 30 % аванс в сентябре, 40 % после демонстрации сайта в октябре, 30 % после приёмки в ноябре.

5 План управления содержанием

Раздел подготовил: Г. Киселев, бизнес-аналитик

5.1 Определение содержания

Подробное описание содержания готовится на основе устава и технического задания. Источники – обследование процессов магазина (пакет 2.1), интервью с управляющим магазином, продавцами и закупщиком, анализ существующих таблиц учёта. Описание содержания согласует управляющий магазином и утверждает спонсор.

5.2 Создание ИСР

ИСР строится декомпозицией по фазам жизненного цикла. Правило 8/80: пакет работ занимает не меньше одного и не больше 20 рабочих дней одного исполнителя (исключение – мониторинг и контроль и работа подрядчика). У каждого пакета есть один измеримый результат и один ответственный. Коды ИСР используются во всех документах: в расписании, смете, реестре рисков и матрице ответственности.

5.3 Подтверждение содержания

Результат пакета принимается в два шага: внутренний контроль качества (проверка тестировщиком или руководителем проекта по критериям приёмки) и приёмка заказчиком с подписью акта или протокола. Акты собираются на контрольных событиях, список принимающих лиц – в разделе 6 устава.

5.4 Контроль содержания

Руководитель проекта еженедельно сравнивает выполненные работы с ИСР. Работа, не входящая в ИСР, выполняется только после одобрения запроса на изменение (подраздел 1.5). Признаки разрастания содержания – новые требования без запроса на изменение, работы без кода ИСР в отчётах о трудозатратах – рассматриваются на еженедельном совещании.

6 План управления требованиями

Раздел подготовил: Г. Киселев, бизнес-аналитик

6.1 Сбор и документирование требований

Требования собираются интервью, наблюдением за работой продавцов и закупщика, анализом таблиц учёта и демонстрацией прототипов форм. Все требования фиксируются в реестре требований с уникальным кодом, источником, приоритетом и критерием приёмки.

Таблица 13 – Категории требований

Категория	Примеры
Бизнес-требования	Окупаемость, сокращение потерь от расхождений остатков
Требования заинтересованных сторон	Отложить товар для покупателя, интерфейс на китайском языке
Функциональные требования	Бронирование, контроль свободного остатка, автоснятие просроченных броней, отчёты
Нефункциональные требования	Проведение документа не дольше 2 с, разграничение прав по ролям, защита персональных данных
Переходные требования	Перенос справочников и остатков, обучение персонала

6.2 Приоритизация

Приоритет назначается по методу MoSCoW: M (обязательно) – без требования система не принимается; S (желательно) – важно, но может быть перенесено в следующую версию; C (возможно) – при наличии времени; W (не в этом проекте). Приоритеты согласует управляющий магазином, спорные вопросы решает спонсор.

6.3 Трассировка требований

Каждое требование связано с бизнес-целью, пакетом ИСР и тест-кейсами. Матрица трассировки обновляется при изменении требований и перед приёмочными испытаниями.

Таблица 14 – Матрица трассировки требований (фрагмент)

Код	Требование	Приоритет	Пакет ИСР	Тест-кейсы
Т-01	Справочник товаров с группами, артикулами и фотографиями	M	4.1	ТС-01 – ТС-04
Т-02	Цены продажи с историей по датам	M	4.1	ТС-05 – ТС-08
Т-03	Поступление и продажа товаров документами с контролем остатка	M	4.2	ТС-09 – ТС-15
Т-04	Разграничение прав ролей «Покупка», «Продажа», «Полные права»	M	4.3	ТС-16 – ТС-18
Т-05	Отчёты по остаткам и продажам	M	4.4	ТС-19 – ТС-21
Т-06	Бронирование товара: бронь уменьшает свободный остаток	M	4.5	ТС-22 – ТС-29
Т-07	Продажа по брони и отмена брони	M	4.5	ТС-30 – ТС-37
Т-08	Удобный ввод документов: подбор, ввод по артикулу	S	4.4	ТС-38 – ТС-42
Т-09	Автоснятие просроченных броней по расписанию	M	4.6	ТС-43 – ТС-48
Т-10	Отчёт «Остаток, забронировано, доступно» по регистрам накопления	M	4.6	ТС-49 – ТС-52
Т-11	Интерфейс и руководство на китайском языке	S	4.7, 7.3	Проверка перевода по глоссарию
Т-12	Выгрузка каталога, цен и остатков на сайт не реже раза в час	M	5.2	Приёмка сайта

6.4 Управление изменениями требований

Новое или изменённое требование после согласования ТЗ (КС3) проходит процедуру подраздела 1.5. Бизнес-аналитик обновляет реестр требований и матрицу трассировки, тестировщик – тест-кейсы. Статусы требования: предложено, согласовано, реализовано, проверено, принято, отклонено.

7 План управления расписанием

Раздел подготовил: Д. Капалбаев, дизайнер интерфейса и фирменного стиля

Таблица 15 – Правила управления расписанием

Параметр	Значение
Методология	Метод критического пути; длительности оцениваются по аналогам и экспертно, для пакетов разработки – трёхточечной оценкой
Единицы измерения	Рабочие дни; трудоёмкость – человеко-дни (8 ч)
Календарь	Пятидневная рабочая неделя, производственный календарь РФ на 2026 год
Точность оценок	Плюс-минус 10 % для пакетов разработки, плюс-минус 5 % для остальных
Инструмент	Диаграмма Ганта в MS Project / GanttProject, копия – в общей папке проекта
Обновление	Каждую пятницу руководитель проекта вносит фактический процент выполнения пакетов
Пороги контроля	SPI ниже 0,9 или угроза сдвига контрольного события больше чем на 3 рабочих дня – эскалация спонсору
Отчётность	Еженедельный статус-отчёт с прогнозом дат контрольных событий

7.1 Оценка длительности

Для пакетов разработки (4.1 – 4.7) применяется трёхточечная оценка PERT: ожидаемая длительность = (оптимистичная + 4 × наиболее вероятная + пессимистичная) / 6. Например, для бронирования товаров (4.5): оптимистично 7, наиболее вероятно 10, пессимистично 14 рабочих дней, ожидаемая длительность – 10,2 дня, принято 10 дней.

7.2 Контроль расписания

При отставании руководитель проекта применяет сжатие расписания: быстрый проход (параллельное выполнение документации и испытаний) или ускорение (привлечение тестировщика к переносу данных). Изменение дат контрольных событий – только через совет по изменениям.

8 План управления стоимостью

Раздел подготовил: С. Шыхыев, технический писатель (руководство пользователя)

Таблица 16 – Правила управления стоимостью

Параметр	Значение
Единицы измерения	Рубли, без НДС для услуг сотрудников, с НДС для закупок; округление до 100 руб.
Точность оценок	Оценка снизу вверх, плюс-минус 10 %
Уровень контроля	Счета контроля – элементы первого уровня ИСР
Метод контроля	Освоенный объём (EVM), еженедельно по пятницам
Пороги	CPI ниже 0,95 – анализ причин; CPI ниже 0,9 или перерасход больше 100 000 руб. – эскалация спонсору
Резервы	Резерв на риски 192 200 руб. использует руководитель проекта при наступлении риска из реестра; управленческий резерв 185 200 руб. – только по решению спонсора
Учёт затрат	Табель трудозатрат по кодам ИСР, счета поставщиков и подрядчика

8.1 Метод освоенного объёма

Таблица 17 – Показатели освоенного объёма

Показатель	Формула	Смысл
PV – плановый объём	по базовому плану на дату	Сколько работ должно быть выполнено
EV – освоенный объём	% выполнения × бюджет пакета	Стоимость фактически выполненных работ по плану
AC – фактическая стоимость	по табелю и счетам	Сколько потрачено
CV, SV	CV = EV – AC; SV = EV – PV	Отклонения по стоимости и срокам
CPI, SPI	CPI = EV / AC; SPI = EV / PV	Индексы эффективности
EAC	BAC / CPI	Прогноз стоимости по завершении
ETC, VAC	ETC = EAC – AC; VAC = BAC – EAC	Сколько ещё потребуется, ожидаемое отклонение

Бюджет по завершении BAC = 3 511 800 руб. (оценка стоимости работ без резервов). Процент выполнения пакета определяется по правилу 0/50/100: 0 % – не начат, 50 % – в работе, 100 % – результат принят.

8.2 Контроль стоимости

Руководитель проекта ведёт журнал расходов и еженедельно рассчитывает показатели. Изменение базового плана по стоимости допускается только через процедуру управления изменениями. Использование резерва на риски фиксируется в реестре рисков с указанием риска и суммы.

9 План управления качеством

Раздел подготовил: Г. Курылев, инженер по тестированию

9.1 Стандарты и требования к качеству

– техническое задание и матрица трассировки требований (раздел 6);
– ГОСТ 34.602-2020 – требования к техническому заданию, ГОСТ Р 59795-2021 – требования к содержанию документов;
– стандарты разработки 1С: проверка конфигурации и модулей без ошибок, управляемые блокировки при проведении;
– Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» для данных покупателей на сайте.

Таблица 18 – Метрики качества

Метрика	Целевое значение	Как измеряется
Доля пройденных тест-кейсов	100 % критичных, не менее 95 % всех	Протокол испытаний
Открытые критичные дефекты на приёмке	0	Журнал дефектов
Ошибки синтаксического контроля модулей	0	Проверка конфигурации в конфигураторе
Время проведения документа	Не более 2 с	Замер на демонстрационной базе
Расхождение остатков после переноса данных	Не более 0,5 % позиций	Сверка с инвентаризацией
Оценка удобства пользователями	Не ниже 4 из 5	Анкета после обучения
Замечания нормоконтроля к документации	Не более 3 на документ после исправления	Лист замечаний

9.2 Обеспечение качества

Обеспечение качества – проверка того, что процессы проекта выполняются правильно: проверки ТЗ и проектных решений на контрольных событиях, совместный просмотр кода конфигурации руководителем проекта и тестировщиком перед передачей на испытания, контрольные списки для документации, аудит процесса тестирования на КС7.

9.3 Контроль качества

Контроль качества – проверка результатов: функциональные испытания по программе (пакет 6.2), приёмочные испытания с заказчиком (6.3), проверка перевода по глоссарию, нормоконтроль документации. Дефекты регистрируются в журнале с кодом, описанием, важностью (критичный, значительный, незначительный) и статусом. Критичные дефекты исправляются до приёмки, повторная проверка обязательна.

Таблица 19 – Контрольные мероприятия по качеству

Мероприятие	Когда	Ответственный
Проверка ТЗ по контрольному списку	КС3	Г. Курылев
Проверка макетов форм и стиля	КС4	Г. Курылев, Д. Капалбаев
Проверка конфигурации и модулей	Перед КС5	А. Фролов
Функциональные испытания	02.11 – 20.11	Г. Курылев
Приёмка интернет-витрины, проверка безопасности	16.11 – 20.11	Г. Курылев
Приёмочные испытания	23.11 – 27.11	Г. Курылев, спонсор
Нормоконтроль документации	До 04.12	Г. Киселев

10 План совершенствования процессов

Раздел подготовил: Г. Курылев, инженер по тестированию

План описывает, как анализировать процессы проекта, чтобы находить потери и повышать их эффективность. Совершенствование выполняется по циклу «планируй – делай – проверяй – действуй» (PDCA).

Таблица 20 – Процессы и их границы

Процесс	Начало	Окончание	Владелец
Разработка функции	Требование согласовано	Функция передана на испытания	А. Фролов
Тестирование и исправление дефектов	Сборка передана на испытания	Дефект закрыт повторной проверкой	Г. Курылев
Подготовка документации	Функция реализована	Документ прошёл нормоконтроль	Г. Киселев
Локализация	Русский текст утверждён	Перевод проверен по глоссарию	Линь Хаоюнь
Управление изменениями	Запрос зарегистрирован	Решение принято и доведено до команды	А. Фролов

Таблица 21 – Метрики процессов и цели улучшения

Метрика	Цель
Доля дефектов, найденных до приёмочных испытаний	Не менее 90 %
Среднее время исправления критичного дефекта	Не более 1 рабочего дня
Доля повторно открытых дефектов	Не более 5 %
Время рассмотрения запроса на изменение	Не более 2 рабочих дней
Отклонение фактической трудоёмкости пакета от плановой	Не более 10 %

На каждом контрольном событии команда проводит короткий разбор: что получилось, что мешало, что изменить. Выводы записываются в реестр извлечённых уроков, а изменения процессов – в план действий с ответственным и сроком. На закрытии проекта (пакет 1.4) реестр передаётся спонсору для следующих проектов.

11 План управления человеческими ресурсами

Раздел подготовил: А. Елизаров, специалист по внедрению и обучению

11.1 Организационная структура



Рисунок 3 – Организационная структура проекта

11.2 Роли и ответственность

Матрица ответственности RACI: R – исполняет, A – отвечает за результат и утверждает, C – консультирует, I – информируется.

Таблица 22 – Матрица ответственности RACI

Результат	Спон-сор	РП	АН	ДЗ	ТС	ТП	ВН	Лок.	Подр.
Устав, план проекта	A	R	C	C	C	C	C	C	–
Техническое задание	A	C	R	C	C	I	I	I	–
Фирменный стиль, макеты	A	C	C	R	I	I	I	I	I
Конфигурация 1С	I	A/R	C	C	C	I	I	C	–
Китайская локализация	I	A	I	I	C	I	I	R	–
Интернет-витрина	I	A	C	C	C	–	–	–	R
Испытания	I	A	C	I	R	I	C	C	C
Документация	I	A	R	R	R	R	C	R	–
Внедрение и обучение	I	A	C	I	C	C	R	C	–
Закрытие проекта	A	R	C	C	C	C	C	C	I

11.3 Ресурсный календарь

Таблица 23 – Загрузка команды по месяцам, чел.-дн.

Роль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Всего
А. Фролов	20,9	30,3	29	16,1	13,6	110
Г. Киселев	22,5	6,1	6	7,4	1	43
Д. Капалбаев	1,8	11,2	9	0	2	24
С. Шыхыев	1	0	3,1	11,9	4	20
Г. Курылев	1	0	8	22,3	1,8	33
А. Елизаров	1	0	0	6	22	29
Линь Хаоюнь	1	0	10	6	1	18
Чжан Жуйюй	1	0	10	6	1	18

Ведущий разработчик загружен сильнее всех в сентябре и октябре, поэтому в этот период он не участвует в документации и обучении. Специалисты по локализации и технический писатель привлекаются с октября.

11.4 Набор, развитие и высвобождение

- все участники работают по срочным трудовым договорам на время проекта, оплата – по табелю фактической загрузки на проекте;
- специалисты по локализации проходят вводный инструктаж по 1С и глоссарию до начала пакета 4.7;
- дизайнер и технический писатель проходят короткое обучение по работе с формами 1С на демонстрационной базе;
- участник высвобождается после приёмки его последнего пакета работ и передачи результатов;
- по итогам контрольных событий руководитель проекта отмечает лучших участников, при достижении КС8 в срок выплачивается премия 10 % от оплаты труда за проект из управленческого резерва по решению спонсора.

11.5 Правила работы команды

– задачи ставятся и закрываются только с кодом пакета ИСР;
– о риске срыва задачи сообщается руководителю проекта в тот же день;
– рабочие файлы хранятся только в репозитории и общей папке проекта, персональные данные покупателей не копируются на личные устройства;
– конфликты решаются в рабочем порядке, при необходимости – с участием руководителя проекта.

12 План управления коммуникациями

Раздел подготовил: А. Елизаров, специалист по внедрению и обучению

План определяет, кто, какую информацию, когда и каким способом получает. Основные каналы: еженедельные совещания (очно или видеосвязь), чат проекта в мессенджере, электронная почта для официальных документов, репозиторий Git и общая папка для файлов.

Таблица 24 – Матрица коммуникаций

Информация	Отправитель	Получатели	Способ	Периодичность
Статус-отчёт (сроки, стоимость, риски)	А. Фролов	Спонсор, команда	Почта, PDF	Еженедельно, пятница
Совещание команды	А. Фролов	Команда	Очно или видеосвязь	Еженедельно, понедельник
Отчёт спонсору по освоенному объёму	А. Фролов	Спонсор	Встреча	Ежемесячно
Приёмка результатов фазы	А. Фролов	Спонсор, управляющий	Встреча, акт	На контрольных событиях
Статус работ подрядчика	Подрядчик	А. Фролов, Чжан Жуйюй	Почта	Еженедельно, четверг
Запросы на изменение и решения	Любой участник	Совет по изменениям	Журнал изменений	По событию
Новости проекта для персонала магазина	А. Елизаров	Продавцы, закупщик	Чат магазина	Раз в две недели
Срочные проблемы, дефекты	Любой участник	А. Фролов	Чат проекта, звонок	Немедленно

12.1 Эскалация

Вопрос, который участник не может решить за один рабочий день, передаётся руководителю проекта. Вопрос, требующий изменения контрольного события, бюджета или содержания, руководитель проекта передаёт на совет по изменениям или спонсору в течение двух рабочих дней.

12.2 Шаблон статус-отчёта

– выполнено за неделю и план на следующую неделю (по кодам ИСР);

– показатели SPI и CPI, прогноз дат контрольных событий;
– новые и изменившиеся риски, открытые проблемы;
– запросы на изменение и принятые решения.

Для китаеязычных сотрудников ключевые объявления дублируются на китайском языке специалистами по локализации.

13 План управления рисками

Раздел подготовил: Линь Хаоюнь, специалист по локализации (китайский язык)

13.1 Методология

Риски выявляются на мозговом штурме при планировании, на каждом еженедельном совещании и на контрольных событиях. Для каждого риска выполняется качественный анализ (вероятность и воздействие по шкалам таблиц ниже) и количественная оценка ожидаемой денежной стоимости (EMV = вероятность × последствия). Сумма EMV всех рисков образует резерв на возможные риски в базовом плане по стоимости.

Таблица 25 – Роли в управлении рисками

Роль	Обязанности
Руководитель проекта	Утверждает реестр рисков, использует резерв на риски
Ответственный за план рисков (Линь Хаоюнь)	Ведёт реестр, проводит еженедельный пересмотр рисков
Владелец риска	Отслеживает триггеры, выполняет меры реагирования
Спонсор	Решает по рискам высокого уровня и управленческому резерву

Таблица 26 – Шкала вероятности

Оценка	Вероятность
1 – очень низкая	до 10 %
2 – низкая	11 – 25 %
3 – средняя	26 – 40 %
4 – высокая	41 – 60 %
5 – очень высокая	более 60 %

Таблица 27 – Шкала воздействия

Оценка	Стоимость	Сроки	Качество
1 – очень низкое	до 20 000 руб.	до 1 дня	Незаметно для пользователей
2 – низкое	до 50 000 руб.	2 – 3 дня	Незначительные недочёты

Оценка	Стоимость	Сроки	Качество
3 – среднее	до 100 000 руб.	4 – 7 дней	Требуется доработка функции
4 – высокое	до 200 000 руб.	8 – 15 дней	Функция не принимается заказчиком
5 – очень высокое	более 200 000 руб.	сдвиг КС8	Система не может использоваться

Ранг риска = вероятность × воздействие. Ранг 12 и выше – высокий (обязательные меры, сообщение спонсору), 6 – 11 – средний (меры по решению владельца), 5 и ниже – низкий (наблюдение).

13.2 Категории рисков

Иерархическая структура рисков: технические (технология, качество), внешние (закупки, безопасность), организационные (ресурсы, стоимость), управления проектом (содержание, внедрение). Возможности (положительные риски) учитываются в том же реестре с отрицательной EMV.

13.3 Реестр рисков

Таблица 28 – Реестр рисков

Код	Риск и причина	Оценка	EMV, руб.	Стратегия и меры	Владелец
P01	Подрядчик срывает срок сдачи интернет-витрины. Причина: загрузка студии другими заказами	В 3 (30 %) Вз 3 Ранг 9 – средний	24 000	Снижение. Поэтапная приёмка, неустойка 0,1 % в день в договоре, еженедельный статус от подрядчика	Чжан Жуйюй
P02	Подрядчик увеличивает стоимость сайта. Причина: изменение требований к витрине после подписания договора	В 2 (25 %) Вз 4 Ранг 8 – средний	27 000	Передача. Договор с фиксированной ценой, изменения только через запрос на изменение	Чжан Жуйюй
P03	Взлом сайта или утечка персональных данных покупателей. Причина: уязвимости CMS, слабые пароли	В 1 (10 %) Вз 5 Ранг 5 – низкий	25 000	Снижение. Требования к защите в договоре, SSL, резервные копии, проверка уязвимостей при приёмке, соблюдение 152-ФЗ	А. Фролов

Код	Риск и причина	Оценка	EMV, руб.	Стратегия и меры	Владелец
P04	Болезнь или уход ведущего разработчика 1С. Причина: вся разработка конфигурации на одном человеке	B 2 (20 %) Bз 4 Ранг 8 – средний	30 000	Снижение. Исходники в Git, описание конфигурации ведётся параллельно, договорённость с внешним разработчиком 1С на замену	А. Елизаров
P05	Изменение требований к бронированию в ходе разработки. Причина: заказчик уточняет порядок работы с резервом	B 3 (40 %) Bз 3 Ранг 9 – средний	36 000	Снижение. Прототип бронирования показывается заказчику до разработки, изменения через совет по изменениям	Г. Киселев
P06	Продажа забронированного товара из-за ошибки контроля остатков. Причина: ошибка в алгоритме свободного остатка	B 2 (20 %) Bз 3 Ранг 6 – средний	12 000	Снижение. Тест-кейсы на бронирование и продажу сверх остатка, блокировки регистров при проведении	Г. Курылев
P07	Задержка поставки сервера или лицензий. Причина: отсутствие оборудования на складе поставщика	B 2 (20 %) Bз 2 Ранг 4 – низкий	6 000	Снижение. Заказ за месяц до установки, резервный поставщик	Чжан Жуйюй
P08	Ошибки при переносе справочников и остатков. Причина: неполные или противоречивые исходные таблицы магазина	B 2 (15 %) Bз 2 Ранг 4 – низкий	7 500	Снижение. Пробный перенос на копии базы, сверка остатков с инвентаризацией	А. Елизаров
P09	Сопротивление персонала новой системе. Причина: привычка к таблицам, страх ошибок	B 3 (30 %) Bз 2 Ранг 6 – средний	12 000	Снижение. Обучение на демонстрационной базе, понятная инструкция, поддержка в период опытной эксплуатации	С. Шыхыев
P10	Неточный перевод интерфейса на китайский язык. Причина: нет единого глоссария терминов	B 2 (20 %) Bз 2 Ранг 4 – низкий	7 200	Снижение. Глоссарий терминов, перекрёстная проверка перевода вторым специалистом	Линь Хаоюнь

Код	Риск и причина	Оценка	EMV, руб.	Стратегия и меры	Владелец
P11	Рост цен на оборудование. Причина: изменение курса валют	В 2 (25 %) Вз 2 Ранг 4 – низкий	10 000	Принятие. Покрывается резервом на непредвиденные расходы	С. Шыхыев
P12	Автоснятие броней не срабатывает, если база не открыта. Причина: в файловом варианте регламентные задания выполняются только при открытом сеансе	В 3 (35 %) Вз 2 Ранг 6 – средний	10 500	Снижение. Форма контроля автоснятия с ручным запуском, описание в инструкции администратора	А. Фролов
B01	Использование типовых механизмов платформы вместо собственной разработки. Причина: в платформе есть готовые регламентные задания и система компоновки данных	В 3 (30 %) Вз 2 Ранг 6 – средний	-15 000	Использование. Проверять наличие типового механизма перед разработкой	А. Фролов

Сумма EMV по реестру – 192 200 руб.; она включена в базовый план по стоимости как резерв на возможные риски.

13.4 Мониторинг рисков

Реестр пересматривается еженедельно: оценки уточняются, закрытые риски помечаются, новые добавляются. При срабатывании триггера владелец риска выполняет меры и сообщает руководителю проекта. Отчёт о рисках входит в еженедельный статус-отчёт.

14 План управления закупками

Раздел подготовил: Чжан Жуйюй, специалист по локализации (китайский язык)

14.1 Решения «производить или покупать»

Таблица 29 – Анализ «производить или покупать»

Что нужно	Решение	Обоснование
Конфигурация 1С	Производить	В команде есть разработчик 1С, требования специфичны для магазина
Интернет-витрина	Покупать (подряд)	Нет веб-разработчика в команде; студия сделает быстрее и с гарантией
Сервер и ИБП	Покупать	Типовое оборудование
Лицензии 1С:Предприятие	Покупать	Обязательны для работы системы
Хостинг и домен	Покупать	Аренда дешевле собственного сервера для сайта

14.2 Типы договоров

Договор на интернет-витрину – с фиксированной ценой (540 000 руб.) и поэтапной оплатой 30/40/30 %, неустойкой 0,1 % за день просрочки и гарантией на исправление дефектов 6 месяцев. Оборудование, лицензии и хостинг – договоры поставки по счёту.

14.3 Выбор подрядчика

Подрядчик для сайта выбирается по запросу предложений не менее чем у трёх веб-студий. Предложения оцениваются по взвешенным критериям, выбирается студия с наибольшим баллом.

Таблица 30 – Критерии выбора подрядчика

Критерий	Вес, %	Как оценивается
Цена	40	Минимальная цена – 10 баллов, остальные пропорционально
Опыт интеграции сайтов с 1С	30	Количество выполненных проектов, отзывы
Срок выполнения	20	Соответствие окончанию до 13.11.2026

Критерий	Вес, %	Как оценивается
Гарантия и безопасность	10	Срок гарантии, меры защиты сайта и персональных данных

Таблица 31 – График закупок

Закупка	Способ	Сроки	Сумма, руб.
Интернет-витрина	Запрос предложений	Запрос 31.08, договор до 18.09	540 000
Хостинг и домен	Прямая закупка	До 02.11	12 000
Сервер и ИБП	Сравнение трёх предложений	Заказ 09.11, поставка до 20.11	185 000
Лицензии 1С	Прямая закупка у партнёра 1С	Заказ 09.11, поставка до 13.11	60 000

14.4 Управление договорами и закрытие

Ответственный за закупки ведёт реестр договоров и еженедельно получает статус от подрядчика. Приёмка сайта проходит по программе испытаний (пакет 5.3), оплата последнего этапа – после подписания акта. Договоры закрываются на фазе закрытия проекта: проверяется исполнение обязательств, оформляются гарантийные письма.

15 План управления заинтересованными сторонами

Раздел подготовил: Чжан Жуйюй, специалист по локализации (китайский язык)

15.1 Реестр заинтересованных сторон

Таблица 32 – Реестр заинтересованных сторон

Сторона	Влияние	Интерес	Ожидания
Генеральный директор (спонсор)	Высокое	Высокий	Окупаемость, соблюдение бюджета и срока
Управляющий магазином	Высокое	Высокий	Достоверные остатки, удобство персонала
Продавцы	Среднее	Высокий	Быстрые продажи и брони, понятный интерфейс
Закупщик	Среднее	Высокий	Удобные поступления, контроль заканчивающихся товаров
Бухгалтер	Среднее	Средний	Отчёты о продажах для сверки
Китаеязычные сотрудники и поставщики	Низкое	Высокий	Интерфейс и инструкция на китайском
Покупатели	Низкое	Средний	Актуальный каталог, возможность отложить товар
Подрядчик – веб-студия	Среднее	Средний	Ясные требования, оплата в срок
Проектная команда	Высокое	Высокий	Понятные задачи, оплата, опыт

15.2 Матрица вовлечённости

Уровни вовлечённости: неосведомлённый, сопротивляющийся, нейтральный, поддерживающий, лидирующий. C – текущий уровень, D – желаемый.

Таблица 33 – Матрица оценки вовлечённости

Сторона	Неосведомлённый	Сопротивляющийся	Нейтральный	Поддерживающий	Лидирующий
Спонсор				C	D
Управляющий магазином				C	D
Продавцы		C		D	
Закупщик			C	D	
Бухгалтер	C		D		

Сторона	Неосведомлённый	Сопротивляющийся	Нейтральный	Поддерживающий	Лидирующий
Китаеязычные сотрудники	C			D	
Подрядчик			C	D	

15.3 Стратегии вовлечения

Таблица 34 – Стратегии работы с заинтересованными сторонами

Сторона	Стратегия	Действия
Спонсор, управляющий	Тесно сотрудничать	Ежемесячные встречи, приёмка на контрольных событиях, участие в совете по изменениям
Продавцы	Вовлекать	Показ прототипов, обучение на демонстрационной базе, сбор отзывов в опытной эксплуатации
Закупщик	Вовлекать	Интервью при обследовании, проверка форм поступления
Бухгалтер	Информировать	Рассылка новостей, демонстрация отчёта о продажах
Китаеязычные сотрудники	Вовлекать	Объявления на китайском, проверка перевода интерфейса на рабочих местах
Подрядчик	Контролировать	Еженедельный статус, поэтапная приёмка

Ответственный за план еженедельно оценивает изменения в уровнях вовлечённости и вместе с руководителем проекта корректирует действия; результаты входят в статус-отчёт.

Список использованных источников

1. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). Пятое издание. – Project Management Institute, 2013.
2. Обзор PMBOK. Пятое издание: краткое изложение // PMJournal. – URL: https://pmjournal.ru/articles/obzory/pmbok-pyatoe-izdanie-kratkoe-izlozhenie/
3. ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Руководство по проектному менеджменту.
4. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.
5. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
6. Устав проекта «Разработка и внедрение информационной системы «ВольтМаркет», редакция 1.0 от 07.08.2026.

Приложение А Распределение работ по подготовке плана

Таблица 35 – Кто подготовил разделы плана

Участник	Роль в проекте	Подготовленные разделы
Фролов Андрей	Руководитель проекта, ведущий разработчик 1С	1 Общие положения; сводная редакция плана; список источников
Киселев Георгий	Бизнес-аналитик, технический писатель (документация по ГОСТ)	2 Базовый план по содержанию; 5 План управления содержанием; 6 План управления требованиями
Капалбаев Дмитрий	Дизайнер интерфейса и фирменного стиля	3 Базовое расписание; 7 План управления расписанием; рисунки ИСР и диаграммы Ганта
Шыхыев Садиг	Технический писатель (руководство пользователя)	4 Базовый план по стоимости; 8 План управления стоимостью
Курылев Григорий	Инженер по тестированию	9 План управления качеством; 10 План совершенствования процессов
Елизаров Александр	Специалист по внедрению и обучению	11 План управления человеческими ресурсами; 12 План управления коммуникациями
Линь Хаоюнь	Специалист по локализации (китайский язык)	13 План управления рисками, реестр рисков
Чжан Жуйюй	Специалист по локализации (китайский язык)	14 План управления закупками; 15 План управления заинтересованными сторонами

Таблица 36 – Лист утверждения

Роль	ФИО	Подпись	Дата
Спонсор проекта, генеральный директор ООО «ВольтМаркет»			14.08.2026
Руководитель проекта	Фролов Андрей		14.08.2026
